



**แนวทางปฏิบัติตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(ว.693 ถว. 6 สิงหาคม 2564)**

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๗๓



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับทราบ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับ
เป็นอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) เพื่ออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งกำหนดไว้สรุปว่า
การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐
ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือกรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า
วันละ ๑๐๐ บาท โดยยกเว้นกรณีสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ และรายงานคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

**เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019**
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

**โดยยกเว้นสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ
ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0**

**อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 162
โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ 0**

**เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019**
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ข้อ 162

โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ 0
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ

สัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่

1. หลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ

- 1.1 สัญญาลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 (ข้อ 1.1.1 – 1.1.6)
- 1.2 สัญญาลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 (ข้อ 1.2.1 – 1.2.3)

2. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

โดยยกเว้นสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ
ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0

ตัวอย่าง

เข้าเงื่อนไข

ส่งมอบงานงวด
สุดท้าย

5 ส.ค. 2564

6 ส.ค. 2564

ว. 693 มีผล

แก้ไขสัญญา 0%

9 ส.ค. 2564

ตรวจรับงานงวด
สุดท้าย

10 ส.ค. 2564

ไม่เข้าเงื่อนไข

ส่งมอบงานงวด
สุดท้าย

5 ส.ค. 2564

6 ส.ค. 2564

ว. 693 มีผล

ตรวจรับงานงวด
สุดท้าย

10 ส.ค. 2564

หน.หน่วยงานของรัฐ เห็นชอบ = สมบูรณ์

ตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว
ไม่มีการแก้ไข
สัญญา
ค่าปรับ 0%

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

1

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563

2

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563

3


สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว
จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรณีลงนามในสัญญา ก่อน วันที่ 26 มี.ค.63



จำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้น เกินร้อยละ 25
ก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563



ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ

ค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้
ส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศ
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มี
การตรวจรับพัสดุ



มีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่ได้มี
การส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศ
ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ




ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึง
ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือ
ให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

3.3 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



กรณีลงนามในสัญญา ก่อน วันที่ 26 มี.ค.63

หากสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ซึ่งได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ



ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

หากสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ



หากมีค่าปรับเกิดขึ้นให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับ วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

หากสัญญาฯ ครอบคลุมหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย



3.3 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรณีลงนามในสัญญา หลัง วันที่ 26 มี.ค.63

สัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ



หากมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0

สัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ



หากมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

สัญญาฯ ครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและมีค่าปรับเกิดขึ้น



ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาแล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

สัญญาฯ ที่ได้ลงนาม หลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว

จะไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการ



1.1.1

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563

1.1.1 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ค่าปรับที่เข้าเงื่อนไขการงดหรือลดค่าปรับตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติฯ หากจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 25 ของวงเงินค่าพัสดุ หรือค่าจ้างก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 กรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

มาตรา 102

การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้
ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

เหตุเกิดจากความผิด
เกิดจากความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวิสัย

เหตุเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใด ที่คู่สัญญา
ไม่ต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย

เหตุอื่นตามที่กำหนดให้
กฎกระทรวง

ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

ตัวอย่าง 1.1.1 ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ



โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 10 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันยังไม่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10

1.1.2

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563

1.1.2 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ และ ไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ 1.1.1 โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

ตัวอย่าง 1.1.2

วันลงนามสัญญา

10 ต.ค. 2562

มูลค่าสัญญา

5 ล้านบาท

วันสิ้นสุดสัญญา

10 มี.ค. 2563


26 มี.ค. 2563

ว.693 ลว.6 ส.ค.2564

ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่

ส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย

31 ส.ค. 2564

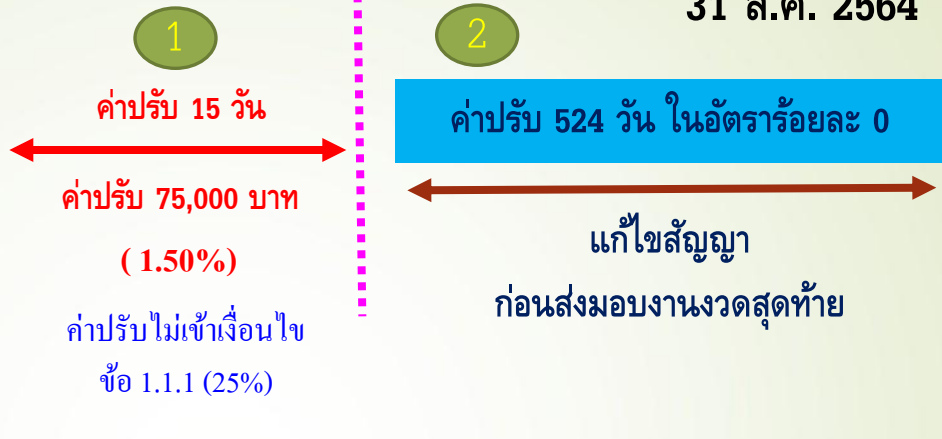

ยังไม่ยกเลิก
ประกาศฯ

ปรับวันละ 5,000 บาท (มูลค่าสัญญา 5,000,000 * อัตราค่าปรับวันละ 0.10%)

- 1 ค่าปรับตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2563 – วันที่ 25 มี.ค. 2563 จำนวน 15 วัน ปรับวันละ 5,000 บาท รวมค่าปรับ 75,000 บาท ($5,000 \times 15$)
- 2 ค่าปรับตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 – วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 31 ส.ค. 2564 จำนวน 524 วัน คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0

1. แก้สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.2 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย)
2. คิดค่าปรับก่อนวันที่ 26 มี.ค. 2563 จำนวน 15 วัน เป็นเงิน 75,000 บาท


โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2563 กำหนดอัตรค่าปรับร้อยละ 0.10 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ก่อนวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.1.3

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563

1.1.3 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ 1.1.1 โดยให้คิดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

ตัวอย่าง 1.1.3

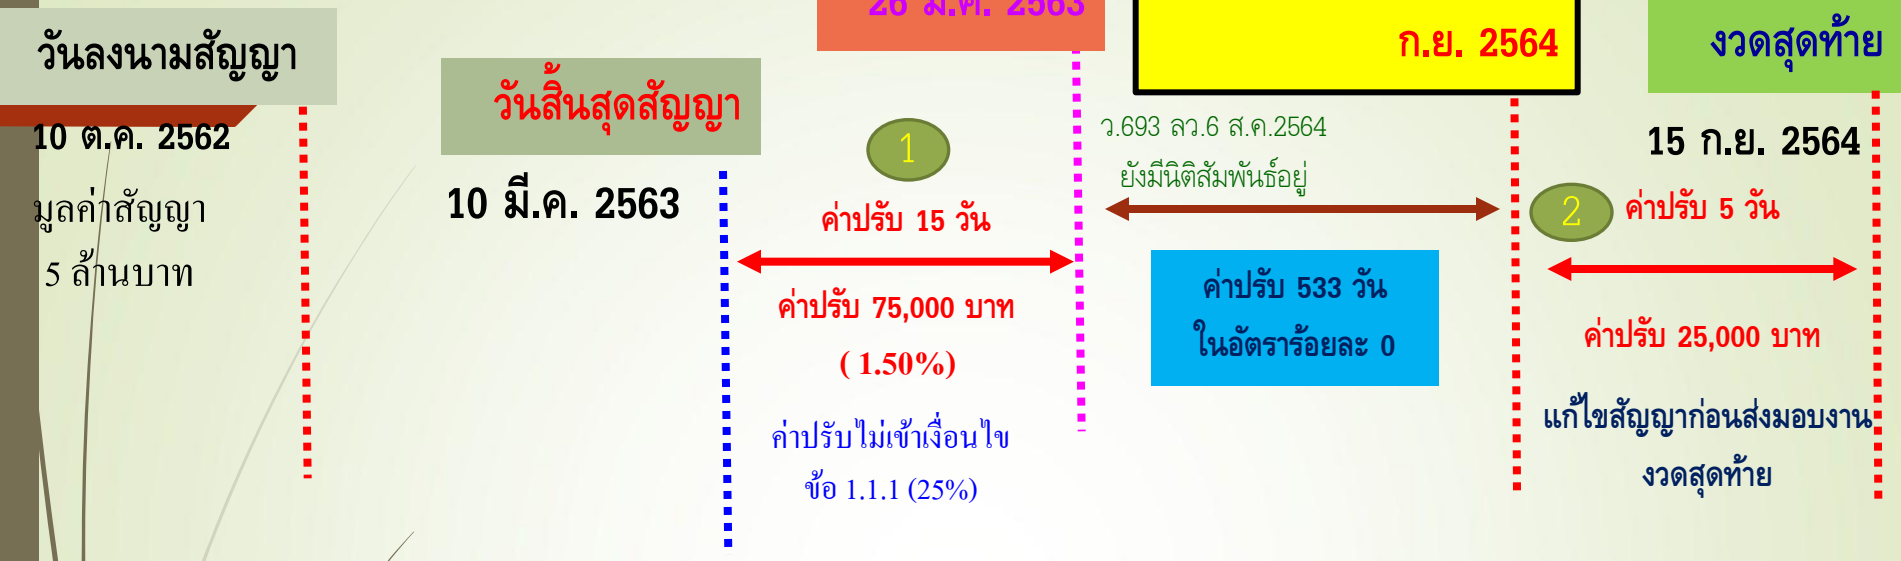

ปรับวันละ 5,000 บาท (มูลค่าสัญญา 5,000,000 * อัตราค่าปรับวันละ 0.10%)

- 1 ค่าปรับตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 2563 – วันที่ 25 มี.ค. 2563 จำนวน 15 วัน ปรับวันละ 5,000 บาท รวมค่าปรับ 75,000 บาท ($5,000 \times 15$)
ค่าปรับตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 – วันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จำนวน 533 วัน คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0
- 2 ค่าปรับตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ก.ย. 2564 จำนวน 5 วัน ปรับวันละ 5,000 บาท รวมค่าปรับ 25,000 บาท ($5,000 \times 5$)

1. แก้สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.3 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย)
2. คิดค่าปรับก่อนวันที่ 26 มี.ค. 2563 จำนวน 15 วัน เป็นเงิน 75,000 บาท คิดค่าปรับหลังวันยกเลิกประกาศฯ วันที่ 10 ก.ย. 2564 จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 25,000 บาท **รวมค่าปรับ 100,000 บาท** ($75,000 + 25,000$)


โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 มีนาคม 2563 กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 **สมมติ** ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 15 กันยายน 2564 (ส่งมอบงานหลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.1.4

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563

1.1.4 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุหากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นโดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาฯ จนถึงวันก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

ตัวอย่าง 1.1.4

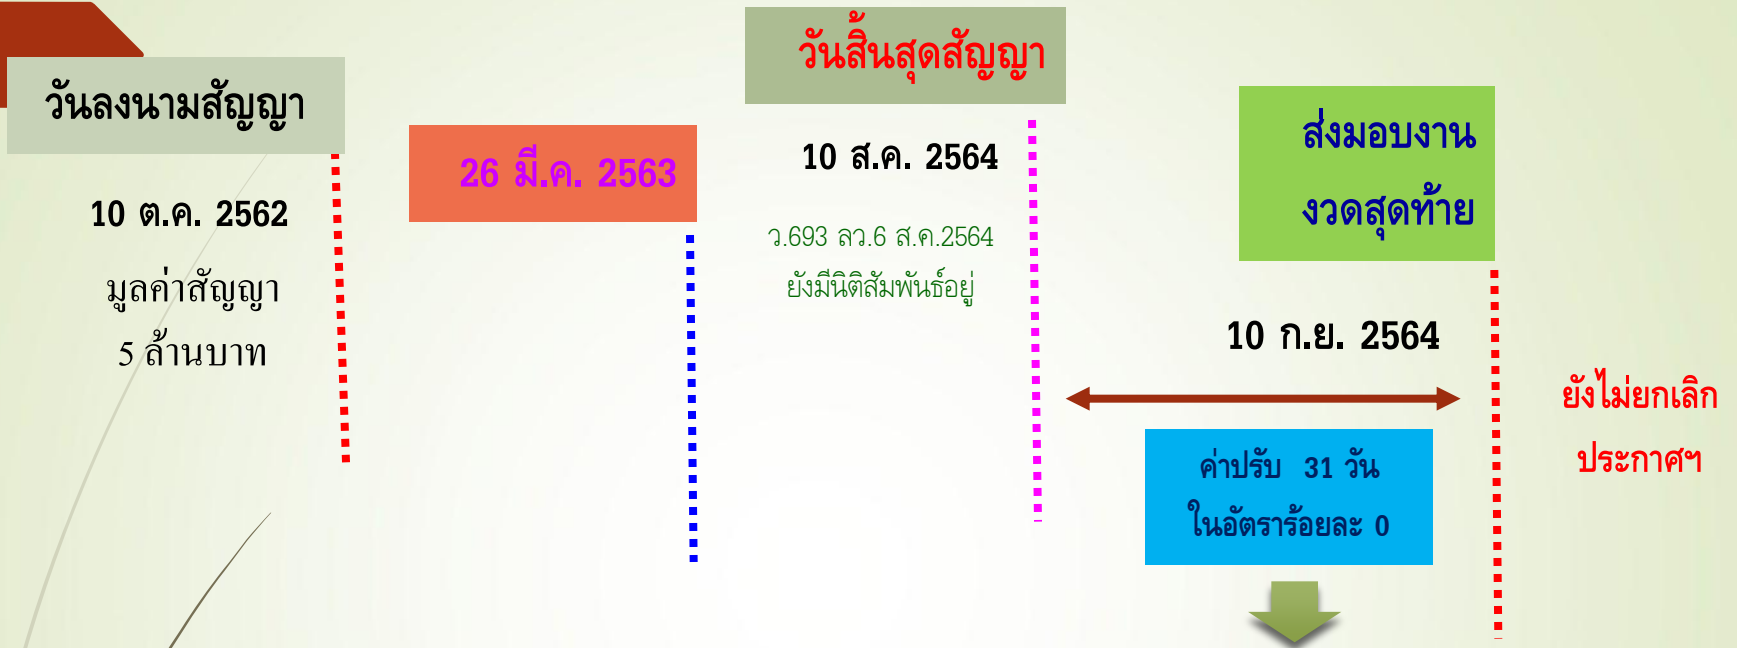

ค่าปรับตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.. 2563 – วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 10 ก.ย. 2564 จำนวน 31 วัน คิดค่าค่าปรับในอัตราร้อยละ 0

*** แก้สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.4 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย) ***


โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคม 2564 กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 10 กันยายน 2564 (ก่อนวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.1.5

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563

1.1.5 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังจากวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

ตัวอย่าง 1.1.5 (กรณีไม่มีค่าปรับ)

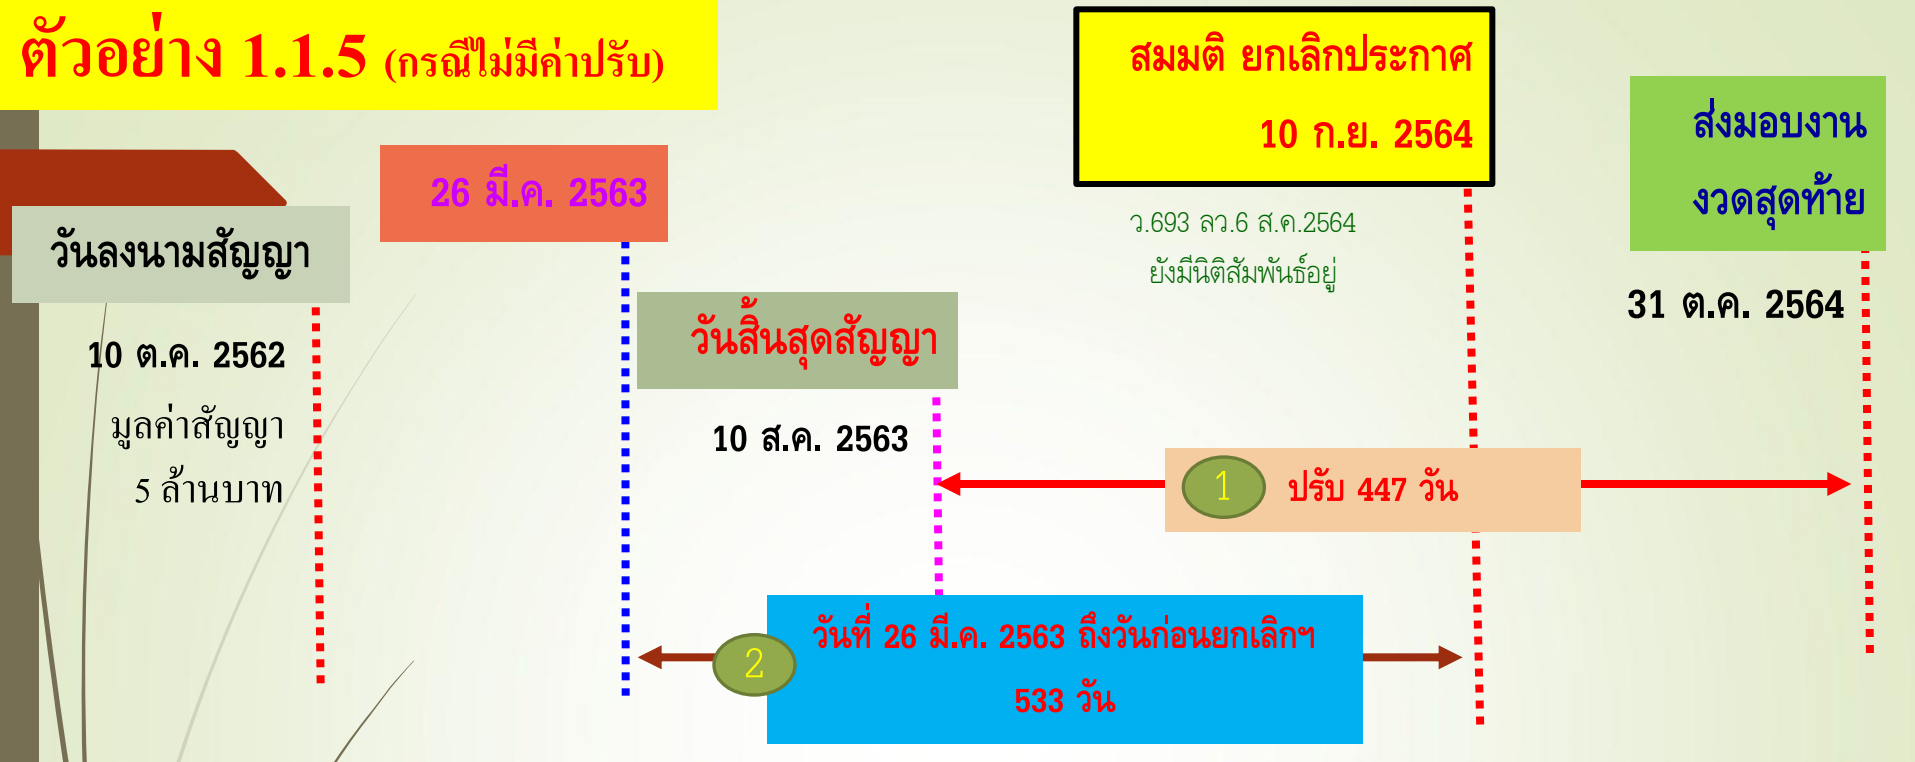


- 1 จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2563 – 31 ต.ค. 2564 จำนวน 447 วัน
- 2 คิดว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 – วันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จำนวน 533 วัน
จำนวนวันคิดว่าปรับเป็น 0 มากกว่า จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ จำนวน 86 วัน (533 วัน – 447 วัน)

ส่วนที่เหลือให้คิด
ค่าปรับตามอัตราปกติ

1. แก้อสัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.5 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย)
2. ไม่มีค่าปรับเนื่องจาก จำนวนวันค่าปรับเป็น 0 มากกว่าจำนวนวันที่เกิดค่าปรับ

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 สมมติ ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

ตัวอย่าง 1.1.5 (กรณีมีค่าปรับ)

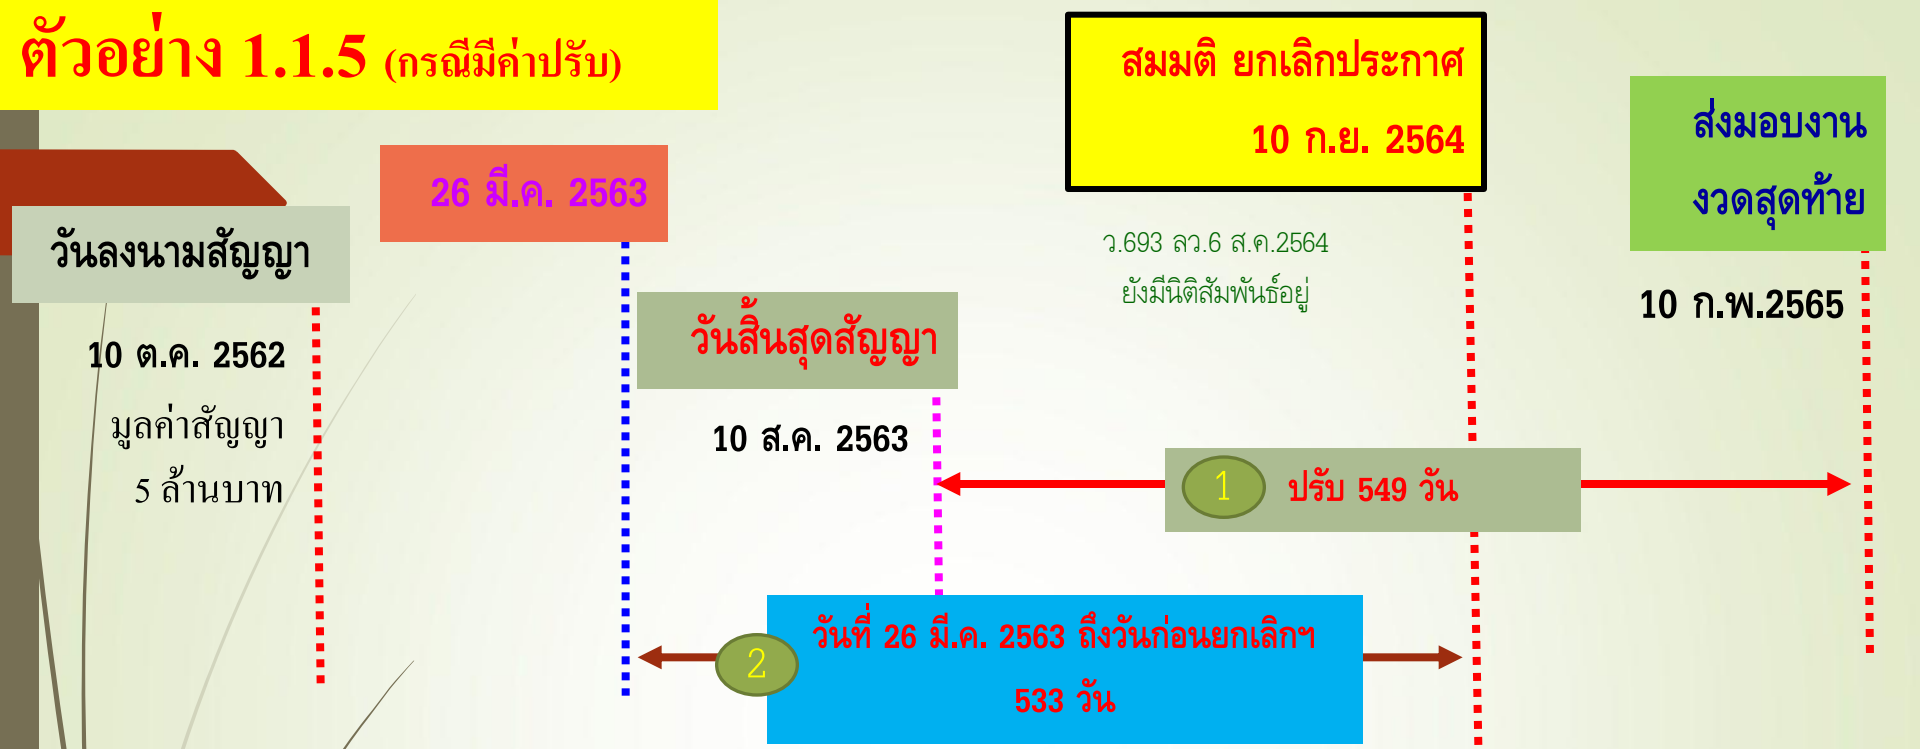

- 1 จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2563 – 10 ก.พ. 2565 จำนวน 549 วัน
 - 2 คิดว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 – วันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จำนวน 533 วัน
- จำนวนวันคิดว่าปรับเป็น 0 น้อยกว่า จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ จำนวน 16 วัน (533 วัน – 549 วัน)
- จำนวนวันที่คิดค่าปรับ จำนวน 16 วัน เป็นเงิน 80,000 บาท (ค่าปรับวันละ 5,000 บาท (5 ล้าน*0.10%) และ (16 วัน * 5,000))


1. แก่สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.5 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย)
 2. คิดค่าปรับ จำนวน 16 วัน เป็นเงิน 80,000 บาท (เนื่องจากจำนวนวันที่คิดค่าปรับ มากกว่าจำนวนวันที่ปรับเป็น 0)
- โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 **สมมติ** ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.1.6

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563

1.1.6 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดหลังประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ มีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องการปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตรา ร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

ตัวอย่าง 1.1.6 (กรณีไม่มีค่าปรับ)

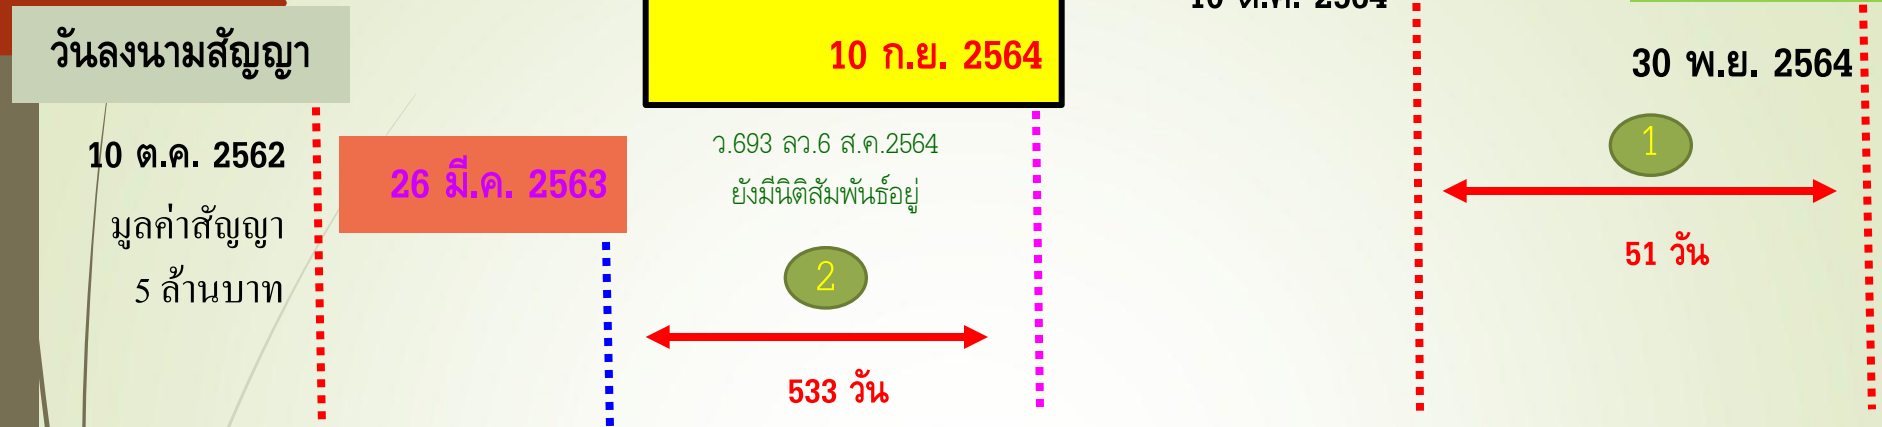


- 1 จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2564 – 30 พ.ย. 2564 จำนวน 51 วัน
- 2 คิดว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 – วันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จำนวน 533 วัน
จำนวนวันคิดว่าปรับเป็น 0 มากกว่า จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ จำนวน 493 วัน (533 วัน – 51 วัน)

1. แก้อสัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.6 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย)
2. ไม่มีค่าปรับเนื่องจาก จำนวนวันค่าปรับเป็น 0 มากกว่าจำนวนวันที่เกิดค่าปรับ

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2564 กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 **สมมติ** ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

ตัวอย่าง 1.1.6 (กรณีมีค่าปรับ)

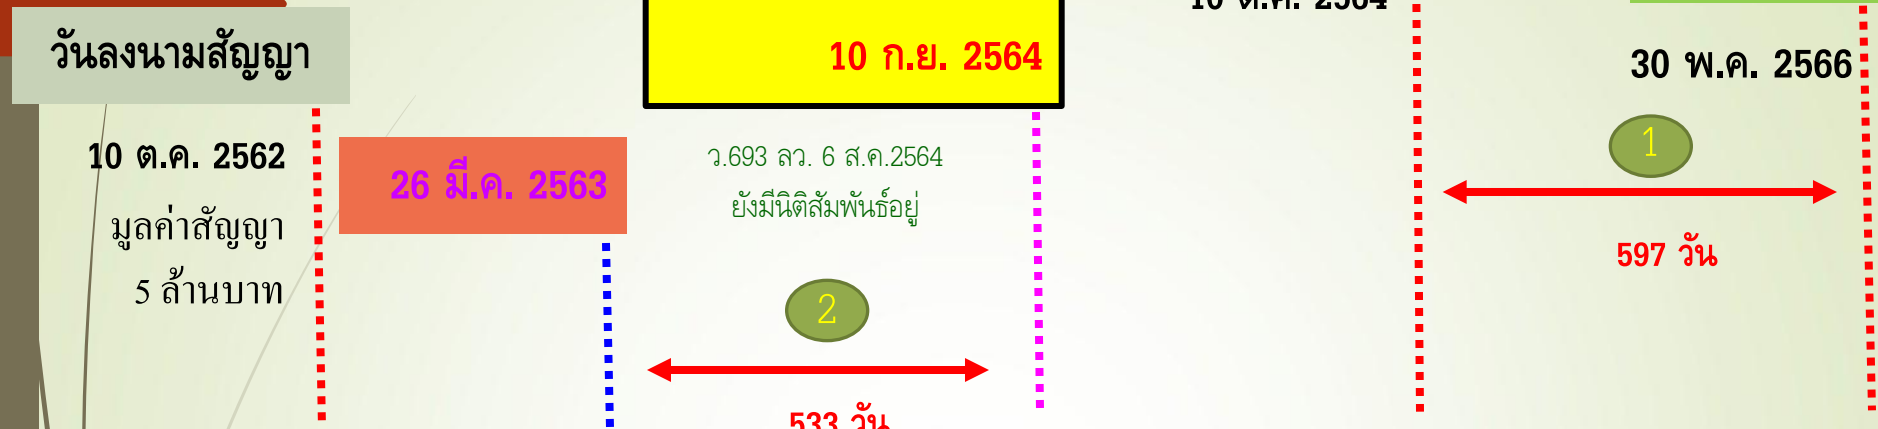

- 1 จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 2564 – 30 พ.ค. 2566 จำนวน 597 วัน
- 2 คิดว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 – วันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จำนวน 533 วัน
จำนวนวันคิดว่าปรับเป็น 0 น้อยกว่า จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ จำนวน 64 วัน (533 วัน – 597 วัน)
จำนวนวันที่คิดค่าปรับ จำนวน 64 วัน เป็นเงิน 320,000 บาท (ค่าปรับวันละ 5,000 บาท ($5 \text{ ล้าน} \times 0.10\%$) และ ($64 \text{ วัน} \times 5,000$))

1. แก้อสัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.1.6 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย)
2. คิดค่าปรับ จำนวน 64 วัน เป็นเงิน 320,000 บาท (เนื่องจากจำนวนวันที่คิดค่าปรับ มากกว่า จำนวนวันที่ปรับเป็น 0)

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2564 กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 **สมมติ** ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.2.1

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563

1.2.1 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ
ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ
กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น
โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0

ตัวอย่าง 1.2.1



ค่าปรับตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.. 2563 – วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 10 ก.ย. 2564 จำนวน 31 วัน คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0

*** แก่สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.2.1 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย) ***


โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคม 2564 กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 10 กันยายน 2564 (ก่อนวันประกาศยกเลิกประกาศ)

1.2.2

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563

1.2.2 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ไม่มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

ตัวอย่าง 1.2.2 (กรณีไม่มีค่าปรับ)

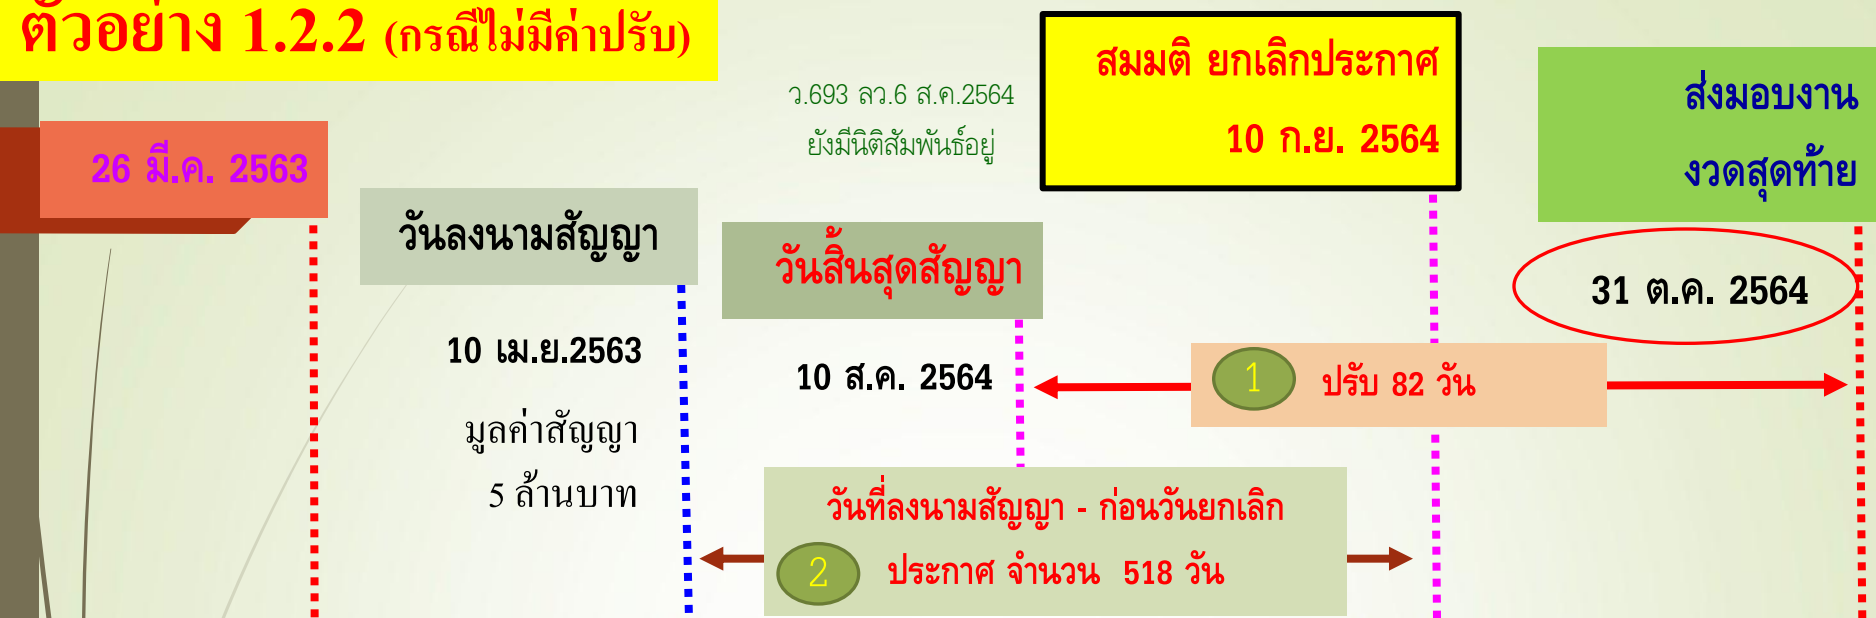


- 1 จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2564 – 31 ต.ค. 2564 จำนวน 82 วัน
 - 2 คิดว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญา 10 เม.ย. 2563 ถึงวันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จำนวน 518 วัน
- จำนวนวันคิดว่าปรับเป็น 0 มากกว่า จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ จำนวน 437 วัน (519 วัน – 82 วัน)

1. แก้สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.2.2 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย)
2. ไม่มีค่าปรับเนื่องจาก จำนวนวันค่าปรับเป็น 0 มากกว่าจำนวนวันที่เกิดค่าปรับ

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคม 2564 กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 **สมมติ** ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

ตัวอย่าง 1.2.2 (กรณีมีค่าปรับ)

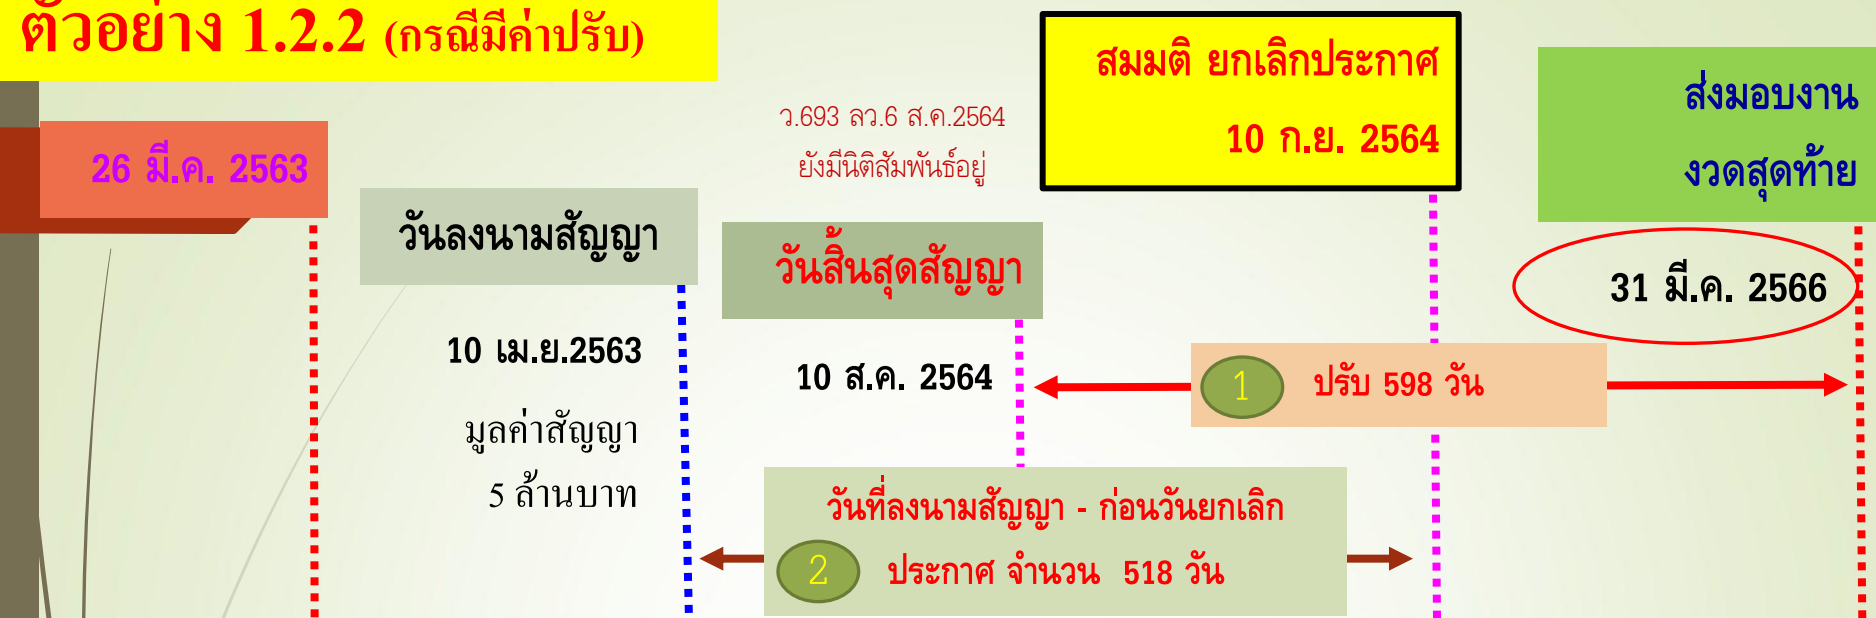

- 1 จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2566 จำนวน 598 วัน
- 2 คิดว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญา 10 เม.ย. 2563 ถึงวันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จำนวน 518 วัน

จำนวนวันคิดว่าปรับเป็น 0 น้อยกว่า จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ จำนวน 80 วัน (518 วัน – 598 วัน)

จำนวนวันที่คิดค่าปรับ จำนวน 80 วัน เป็นเงิน 400,000 บาท (ค่าปรับวันละ 5,000 บาท (5 ล้าน*0.10%) และ (80 วัน * 5,000))

1. แก่สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.2.2 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย)
2. คิดค่าปรับ จำนวน 80 วัน เป็นเงิน 400,000 บาท (เนื่องจากจำนวนวันที่คิดค่าปรับ มากกว่า จำนวนวันที่ปรับเป็น 0)

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 สิงหาคม 2564 กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 **สมมติ** ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 31 มีนาคม 2566 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.2.3

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามลงวันที่ 26 มีนาคม 2563

1.2.3 สัญญาฯ ที่ได้ลงนามลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญาฯ ดังกล่าวครบกำหนดลงวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

ตัวอย่าง 1.2.3 (กรณีไม่มีค่าปรับ)



- 1 จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2564 – 31 ต.ค. 2564 จำนวน 46 วัน
 - 2 คิดว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญา 10 เม.ย. 2563 ถึงวันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จำนวน 518 วัน
- จำนวนวันคิดว่าปรับเป็น 0 มากกว่า จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ จำนวน 472 วัน (518 วัน – 46 วัน)

1. แก่สัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.2.3 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย)
2. ไม่มีค่าปรับเนื่องจาก จำนวนวันค่าปรับเป็น 0 มากกว่าจำนวนวันที่เกิดค่าปรับ

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2564 กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 **สมมติ** ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

ตัวอย่าง 1.2.3 (กรณีมีค่าปรับ)



- 1 จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2564 – 31 มี.ค. 2566 จำนวน 562 วัน
- 2 คิดว่าปรับเป็น 0 ตั้งแต่วันที่ลงนามสัญญา 10 เม.ย. 2563 ถึงวันก่อนประกาศยกเลิกฯ 9 ก.ย. 2564 จำนวน 518 วัน
จำนวนวันคิดว่าปรับเป็น 0 น้อยกว่า จำนวนวันที่เกิดค่าปรับ จำนวน 44 วัน (518 วัน – 562 วัน)
จำนวนวันที่คิดค่าปรับ จำนวน 44 วัน เป็นเงิน 220,000 บาท (ค่าปรับวันละ 5,000 บาท (5 ล้าน*0.10%) และ (44 วัน * 5,000))

1. แก้อสัญญาฯ ให้สอดคล้องกับ ข้อ 1.2.3 (ก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย)
2. คิดค่าปรับ จำนวน 44 วัน เป็นเงิน 220,000 บาท (เนื่องจากจำนวนวันที่คิดค่าปรับ มากกว่า จำนวนวันที่ปรับเป็น 0)

โครงการก่อสร้างอาคาร มูลค่าสัญญา 5 ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน 2564 กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 **สมมติ** ได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ วันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 31 มีนาคม 2566 (หลังวันประกาศยกเลิกประกาศฯ)

1.3 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตราการนี้

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณาหรือลงค่าปรับให้แก่คู่สัญญาฯ หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาฯ ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 102 แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนวันตามมาตราการนี้ และจำนวนวันที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0

สำหรับค่าปรับส่วนที่เกินจำนวนวันตามมาตราการนี้ ให้คิดในอัตราที่กำหนดในสัญญาฯ ตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 183 ต่อไป (ค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง)

2. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญาฯ ให้สอดคล้องกันต่อไป

มา...คล้ายข้อสงสัย ว.693 ...???

1. กรณีสัญญายังมีนิติสัมพันธ์ คืออะไร
2. ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีหรือไม่ (ข้อ 162)
3. สัญญาลงนามวันที่ 26 มี.ค. 2563 ให้นับก่อน หรือหลัง วันที่ 26 มี.ค. 2563
4. แก้ไขสัญญาในอัตราร้อยละ 0 ดำเนินการเมื่อใด (ให้คู่สัญญาร้องขอหรือไม่)
5. กรณีส่งมอบงานงวดสุดท้าย ได้คิดค่าปรับ และเบิกจ่ายเงินแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร (คู่สัญญาขอคืนค่าปรับ)
6. กรณีหักค่าปรับไว้ระหว่างงวดงาน แต่ยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ค่าปรับที่ได้หักไว้แล้วต้องดำเนินการอย่างไร (ว.423 ลว. 10 ก.ย. 2563)

มา...คล้ายข้อสงสัย ว.693 ...???

7. กรณีคู่สัญญาที่มีพฤติกรรมเชื่อได้ว่างานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
ทำอย่างไร

8. การแก้ไขสัญญาต้องลงนาม 2 ฝ่าย หรือไม่

9. ข้อความที่ใช้ในการแก้ไขสัญญาอ้างข้อกำหนดอย่างไร

(มาตรา 97 (3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ)

10. การแก้ไขสัญญาในระบบ e-GP ทำอย่างไร

ขอบคุณค่ะ

